

**Государственное Унитарное Предприятие  
"Душанбеводоканал»  
Проект водоснабжения и водоотведения г. Душанбе**

**Отчёт о результатах рамочной программы  
экологического и социального управления за 2 квартал  
2023 года.**

## Оглавление

<b>1. Введение.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Цели и задачи.....</b>	<b>2</b>
<b>3. Требования по соблюдению экологических гарантий.....</b>	<b>2</b>
<b>4. Институциональные механизмы для реализации проекта .....</b>	<b>3</b>
<b>5. Статус выполнения мероприятий по управлению экологическими рисками .....</b>	<b>3</b>
<b>6. Реализация механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) .....</b>	<b>3</b>
<b>7. Отчет плана мероприятий по защите от COVID-19.....</b>	<b>3</b>
<b>8. Анализ хода строительных работ по соблюдению требований правил охраны окружающей среды и социальных гарантий. ....</b>	<b>7</b>
<b>9. Фотоматериалы.....</b>	<b>8</b>

## 1. Введение

Целью проекта по водоснабжению и водоотведению города Душанбе является совершенствование услуг по водоснабжению и очистке сточных вод в выбранных районах Душанбе, а также совершенствование управления финансами и общей результативности водоснабжения.

Проект включает три компонента: Компонент 1: укрепление институциональной базы и наращивание потенциала; Компонент 2: совершенствование систем водоснабжения и водоотведения; и Компонент 3: Управление проектами. Основные виды деятельности в рамках компонента 1 направлены на расширение технической помощи Душанбинскому водоканалу (ДВК) для целей корпоративного развития, операций, а также улучшения финансового менеджмента. Компонент 2, состоящий из подкомпонентов 2А и 2В, поддерживает материальные вложения и подготовку инженерных конструкций и услуг по надзору за строительством (НС), направленных на совершенствование приоритетных систем водоснабжения и водоотведения в городе Душанбе. Компонент 3 финансирует общие эксплуатационные расходы ДВК и его группы по реализации проектов (ОРП) для координации, осуществления, администрирования и мониторинга проекта.

В рамках подкомпонента 2А, проект поддерживает инвестиции в водоснабжение и поддержку водопроводных сетей в районе Сино города Душанбе. Этот подкомпонент будет финансировать инвестиции в водоснабжение для замены магистральных водопроводных и подпорных насосов и строительства двух резервуаров для хранения воды объемом 6000 м<sup>3</sup> в районе Сино города Душанбе. Расположение и диаметр трубопроводов, подлежащих замене, будут основаны на гидравлической модели, которая будет разработана в рамках действующего проекта. Прямые преимущества этого подкомпонента будут заключаться в сокращении не приносящей доход воды за счет уменьшения утечек воды. Таким образом, это увеличит доступность воды для населения и снизит частоту прерывистого водоснабжения.

## 2. Цели и задачи

Предоставление статуса реализации, выполнения и соответствия экологических и социальных вопросов, включая управление рисками ООС, взаимодействие с заинтересованными сторонами, гендерные вопросы, процедуры управления трудовыми ресурсами за отчетный период.

## 3. Требования по соблюдению экологических гарантий

Закон Республики Таджикистан «Об охране окружающей среды» определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды и направлен на обеспечение устойчивого социально-экономического развития, гарантии прав человека на здоровую и благоприятную окружающую среду, укрепление правопорядка, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, организацию рационального использования природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности.

Проект инициирует осуществление ОП 4.01 Всемирного банка, по экологической оценке, (ЭО), поскольку он вызовет некоторые экологические и социальные воздействия. Поскольку подробная информация об инвестициях и местонахождении проекта известна, в соответствии с операционной политикой 4.01 Всемирного банка была подготовлена оценка воздействия на окружающую и социальную среду для определения и устранения (предотвращения или минимизации) возможных воздействий. В рамках проекта будут приняты руководящие принципы группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности для обеспечения надежной практики в области охраны труда, здоровья и безопасности во время строительства. В зависимости от характера, типа и масштаба воздействия на окружающую среду и социальную сферу, проект был отнесен к категории В.

#### 4. Институциональные механизмы для реализации проекта

В отделе техники безопасности и охраны труда ГУП «Душанбеводоканал» работают 4 инженера по ОТ и ТБ.

Специалист по охране окружающей среды вместе со специалистом по социальным гарантиям ОРП DWSWP осуществляют надзор за выполнением ПЭСУ с учетом экологических и социальных рамок управления/планов по управлению окружающей средой и социальной сферой, а также контрольных перечней, которые подготовлены для подпроектов. Специалист по охране окружающей среды осуществляет надзор за группами подрядчиков для обеспечения того, чтобы все обязательства по охране окружающей среды, изложенные в ПУОСС были включены в строительные работы и рабочие процессы.

#### 5. Статус выполнения мероприятий по управлению экологическими рисками

**5.1. Контракт DWSWP/W-01** строительные работы по замене трубопроводов: начала работы 07.02.2021г. завершения работ конец марта 2023г.

А так же в ходе реализации Проекта было установлено, что на 4 ( №34,35,37,39) участках района Сино, которые рассчитаны на обеспечение более 14400 человек питьевой водой, из-за холмистости рельефа местности не может быть обеспечена требуемым давлением воды. В связи с этим со стороны ГУП «Душанбеводоканал» было отправлено электронное письмо в адрес Всемирного Банка для использования сэкономленных средств для строительства 4 насосных станций третьего подъема на данных участках. После получения одобрения Банка было решено, что строительство 4 насосных станций третьего подъема может быть добавлено в качестве дополнения к текущему контракту с ОАО «ТГЭМ».

Поправка №2 к текущему контракту заключено с 15 марта 2023 года по 15 октября 2023 года для выполнения строительных работ по строительству и установке насосов 4 насосных станций третьего подъема на 4 участках района Сино.

В подрядной организации специалиста по ООС не имеется, однако работает инженер по охране труда и техники безопасности, который подготовил ПУОСС.

После прокладки трубопроводов дороги и тротуары были восстановлены в исходное состояние т.е. покрыты асфальтом или бетоном.

Каждый день перед началом работы, согласно ПУОСС, все виды работ в соответствии с допусками на работу или заказы согласовываются с менеджерами строительного участка. Со стороны инженера ТБ подрядчика ведутся надзор за выполнением обеспечения средства индивидуальной защиты, коллективной защиты, инструментов и приспособлений.

Каждый день перед началом строительных работ проверяются установлены ли информационные щиты, знаки безопасности, временные ограждение и т.п.. Менеджера участка, инженер ОТ и ТБ подрядной организации ТГЭМ соблюдают координацию маршрута движения персонала по территорию объекта.

За отчетный период на строительных участках несчастных случаев не зафиксировано.

**5.2. Контракт №DWSWP/W-02** строительные работы по замене трубопроводов: начала работы 19.02.2021г. завершения работ конец марта 2023г. Замена трубопровода протяженностью в 14,1км. В подрядной организации специалиста по ООС не имеется, однако работает инженер по охране труда и техники безопасности.

После прокладки трубопроводов плодотворные слои земли, дороги и тротуары, которые находятся под влиянием проекта были восстановлены в исходное состояние т.е. покрыты асфальтом или бетоном.

Ежедневно перед началом работ руководитель участка (мастер, бригадир) проводит целевое обучение мер безопасности с работниками. Все виды работ выполняются в соответствии с разрешениями со стороны руководства организации.

Все работники в соответствии строительных работ обеспечены с средствами индивидуальной защиты, инструментами и приспособлениями.

При выполнении опасных работ с рабочими проводят дополнительный инструктаж по технике безопасности.

За отчетный период на строительных участках несчастных случаев не зафиксировано.

Строительные работы по замене трубопроводов питьевой воды Контракта №DWSWP/W-02 завершены благополучно. После завершения строительных работ было установлено, что после замены трубопроводов намного улучшилось качество и давление воды, чем весьма довольны жители этих участков и микрорайонов.

Данный контракт после завершения дал эффективные результаты по качеству и давлению питьевой воды, что означает о результативности достижения целей и задач.

**5.3. Контракт №DWSWP/W-03** строительные работы по замене трубопроводов: начала работы 20.10.2021г. завершения работ 20.09.2023г. Замена трубопровода протяженностью в 20,7км.

При проведении строительных работ по замене трубопроводов от улицы Н.Ганчави до махалли Навобод участка №3, возле Мечети возникли проблемы, то есть по той трассе что должны были провести трубопровод питьевой воды, проходит 2 линии канализационных труб диаметрами 150 и 250. Для решения возникшей проблемы был создан технический совет ГУП «Душанбеводоканал». Техническим советом во главе главным инженером ГУП «Душанбеводоканал» было принято решение, что сначала должны демонтироваться обе линии канализационных труб, после произвести монтаж одной линии канализационных труб диаметром 400 с одной стороны улицы и потом проложить трубопроводы питьевой воды с противоположной стороны улицы и соблюсти все меры во избежание пересечения канализационных и водопроводных труб.

Строительные работы на данном участке до разработки проектно-изыскательных работ временно приостановлены. После разработки проектно-изыскательных работ, строительномонтажные работы по прокладке трубопроводов питьевой воды будут возобновлены.

В подрядной организации работает инженер по охране труда и техники безопасности, который подготовил ПУОСС.


Перед началом строительномонтажных работ, инженерами строительных участков проводятся целевые обучения работников в целях улучшения мер безопасности в ходе строительных работ. Все виды работ выполняются в соответствии с планом работ.

Все работники в соответствии строительных работ обеспечены с средствами индивидуальной защиты, строительными инструментами и приспособлениями.

Все виды работы согласовываются с руководством перед началом строительных работ.

На строительных участках установлены информационные щиты и знаки безопасности дорожного движения.

За отчетный период на строительных участках в ходе строительства несчастных случаев не зафиксировано.

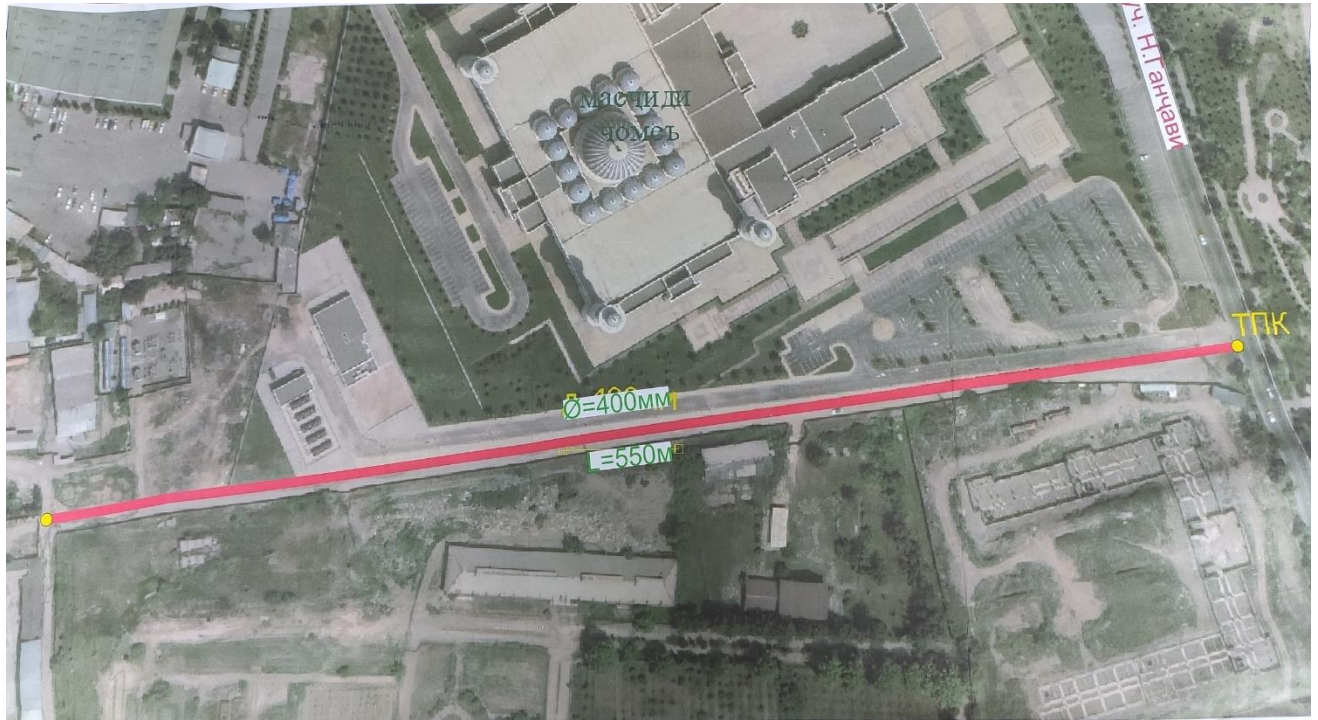

## ПРОТОКОЛИ №10

ҷаласаи Шӯрои техникий Корхонаи воҳиди давлатии «Обу корезӣ Душанбе»-и мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе

аз 27 майи соли 2023

шаҳри Душанбе

Дар ҷаласа роҳбарият ва ҳайати Шӯрои техникий иштирок доштанд (рӯйхати иштирокдорон замима мегардад).

### РЀЗНОМАИ ҶАЛАСА:

Ҷаласа таҳти раёсати роҳбари Шӯрои техникий С. Қаландаров (сармуҳандисӣ Корхона) доир гардида, баъд аз эълони рӯзномаи ҷаласа раисикунанда қайд намуд, ки дар ин давра оиди ба даст овардани шартҳои техникий дар самти пайваस्तшавӣ ба шабакаҳои оби нӯшоқӣ ва корезӣ аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии зерин дархост ворид гардид;

- 1. Дархостҳои сармуҳандисии КВД “Обу корези Душанбе”, сардори шӯъбаи истехсоли техникий:**

1/11 Бо дархости сармуҳандиси КВД “Обу корези Душанбе” ва сардори шуъбаи истеҳсоли техникӣ ба гуруҳи амалӣсозии Лоихаи “Обтаъминкунӣ ва корезии шаҳри Душанбе” хотиррасон менамоем, ки аз кучаи Н. Ганҷавӣ то маҳаллаи Навобод хатти мавҷудаи корезии қутраш 250мм-ро ба кубури 400мм бо дарозии 550 метр иваз намудан лозим мешуморем.

### 1. Дархостҳо аз ноҳияи Исмоили Сомонӣ:

1.1. Мурочиати шаҳрванд Ҳ. Калонов, оиди пайваст намудани кубури оби нӯшоқӣ ба хонаи истиқоматӣ, воқеъ дар кӯчаи Радишев №31, ноҳияи И.Сомонии шаҳри Душанбе.

1.2. Мурочиати шаҳрвақд Ш. Негматова, оиди пайваст намудани кубури корезӣ ба хонаи истиқоматӣ, воқеъ дар кӯчаи Сурхоб №9, ноҳияи И.Сомонӣ шаҳри Душанбе.

1.3. Мурочиати шаҳрванд Ф.Ашуров, оиди пайваст намудани кубури оби нӯшоқӣ ва корезӣ ба хонаи истиқоматӣ, воқеъ дар кӯчаи Зайнаб-бибӣ №182, ноҳияи И.Сомонӣ шаҳри Душанбе.

### 2. Дархостҳо аз ноҳияи Шоҳмансур:


2.1. Мактуби ЧДММ «Бухоро Палас», аз 16 майи соли 2023, №8/171, чиҳати пайвастшавии иншооти Сохтмони бинои баландошӯнаи истиқоматии 15- ошӯна бо ҷойгиронии марказҳои савдону хизматрасонӣ ва маркази тиббӣ дар ошӯнаҳои аввал ва таваққуфҳои нақлиётӣ дар таҳхонаи он, воқеъ дар кӯчаи

ошӯнаи ба он ҳамроҳчаспондасохташаванда ва сохтмони 2-бинои хобгоҳ барои донишҷӯён, воқеъ дар кӯчаи Н.Маҳсум №63/1, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе., ба шабакаҳои оби нӯшоқӣ ва корезӣ.

1. Шуъбаи истеҳсолию-техникии Корхона тибқи тартиби муқарраргардида ва дар доираи меъёру қоидаҳои соҳавӣ лоихаи шартҳои техникиро омода намуда, чиҳати тасдиқ ба роҳбари Корхона манзур намояд.

2. Назорати иҷроӣ қарори ҷаласаи Шӯрои техникӣ ба зиммаи сармуҳандиси Корхона воғузур карда шавад.

Роҳбари Шӯрои техникӣ



С. Қаландаров.

Котиби Шӯрои техникӣ

 С. Сафаров

Замима

ба рузномаи чаласаи  
Шурои техникӣ  
27 май соли 2023

Р Ё Й Х А Т И

иштирокдорони чаласаи кушодашавии Шурои техникӣ

№ р/т	Ному насаб	Вазифа	Шинос шуданд
1	С. Қаландаров	Сармуҳандис	
2	С. Сафаров	Сардори шӯъбаи истеҳсолию техникӣ	
3	И. Табарзода	Муовини сармуҳандис оид ба обтаъминкунӣ	
4	А. Санъат	Муовини сармуҳандис оид ба корезӣ	
5	Ш. Тағоев	Сардори қитъаи истифодабарии кубурҳои оби нушокии ноҳияи Исмоили Сомонӣ	
6	Н. Содиков	Сардори қитъаи истифодабарии кубурҳои оби нушокии ноҳияи Шохмансур-1	
7	Б. Саидов	Сардори қитъаи истифодабарии кубурҳои оби нушокии ноҳияи Шохмансур-2	
8	Р. Раҳмонов	Сардори қитъаи истифодабарии кубурҳои оби нушокии ноҳияи Фирдавсӣ	
9	М. Ҳалимов	Сардори қитъаи истифодабарии кубурҳои оби нушокии ноҳияи Сино-1	
10	Х. Холматов	Сардори қитъаи истифодабарии кубурҳои оби нушокии ноҳияи Сино-2	
11	Ф. Камолов	Сардори Хадамот оид ба бартарафсозии садамаҳои корезӣ	
12	Ҷ. Мирзоев	Сардори ҳисобкунакҳои оби	



**5.4. Контракт №DWSWP/W-04** строительные работы по замене трубопроводов: начала работы 17.03.2022г. завершения работ 17.03.2024г. Замена трубопровода протяженностью в 19,6 км. В подрядной организации специалиста по ООС не имеется, однако работает инженер по охране труда и техники безопасности, который подготовил ПУОСС.

Перед началом строительно монтажных работ инженерами строительных участков проводятся целевые обучения работников.

Все работники в соответствии строительных работ обеспечиваются с средствами индивидуальной защиты, строительными инструментами и приспособлениями.

Все виды работы согласовываются с руководством до начала работ.

На строительных участках были установлены информационные щиты и знаки безопасности дорожного движения.

За отчетный период на строительных участках в ходе строительства несчастных случаев не зафиксировано.

**5.5. Контракт №DWSWP/W-06** строительные работы по замене канализационных трубопроводов и коллекторов: начала работы 11.05.22г. завершения работ 11.05.2024г. Замена трубопровода протяженностью в 12,3 км. В подрядной организации специалиста по ООС не имеется, однако работает инженер по охране труда и техники безопасности, который подготовил ПУОСС.

На строительных участках со стороны инженеров проводятся целевые обучения работникам по технике безопасности.

Строительные работы выполняются в соответствии после допуска со стороны руководства.

Работники на строительных участках обеспечены с средствами индивидуальной защиты, касками, масками для лица или глаз и строительными инструментами.

При выполнении опасных работ с рабочими инженер участка проводит дополнительный инструктаж по технике безопасности.

За отчетный период на строительных участках несчастных случаев не зафиксировано.

**5.6. Контракт №DWSWP/W-07** строительные работы по замене канализационных трубопроводов и коллекторов: начала работы 01.06.22г. завершения работ 01.06.2024г. Замена трубопровода протяженностью в 13,1 км. В подрядной организации работает инженер по охране труда и техники безопасности, который подготовил ПУОСС.

Ежедневно перед началом работы, согласно ПУОСС, все виды работ в соответствии с допуском работников согласовываются с инженерами строительных участков.

Со стороны начальника участка и инженера ОТ и ТБ ведутся надзор за выполнением обеспечения средства индивидуальной защиты, инструментов и приспособлений.

На строительных участках перед выполнением опасных работ со стороны инженер ТБ проводится дополнительный инструктаж.


Но специалистами ОРП по экологические и социальные защиты были выявлены, что не всегда соблюдаются меры защиты такие, как не ношение касок или же работы велись без рукавиц и тому подобное, на что были предупреждены устно, проведены разъяснительные работы по технике безопасности, после чего замечания были устранены.

За отчетный период на строительных участках несчастных случаев не зафиксировано.

**5.7. Контракт № DWSWP/W-05.**

СПДП для двух резервуаров, разработан и одобрен специалистами Банка.

После проведения тендера и изучения представленных со стороны участников тендера тендерных документаций, с одобрения Банка и указом председателя города Душанбе №336 от 15 июня 2023 года, заключено контрактное соглашение **Контракт № DWSWP/W-05** между ГУП «Душанбеводоканал» и СПОО «Интерсохтмон» и ОАО «ТГЭМ» с 15 июня 2023 года для строительства двух резервуаров для воды по 6000 м<sup>3</sup>.

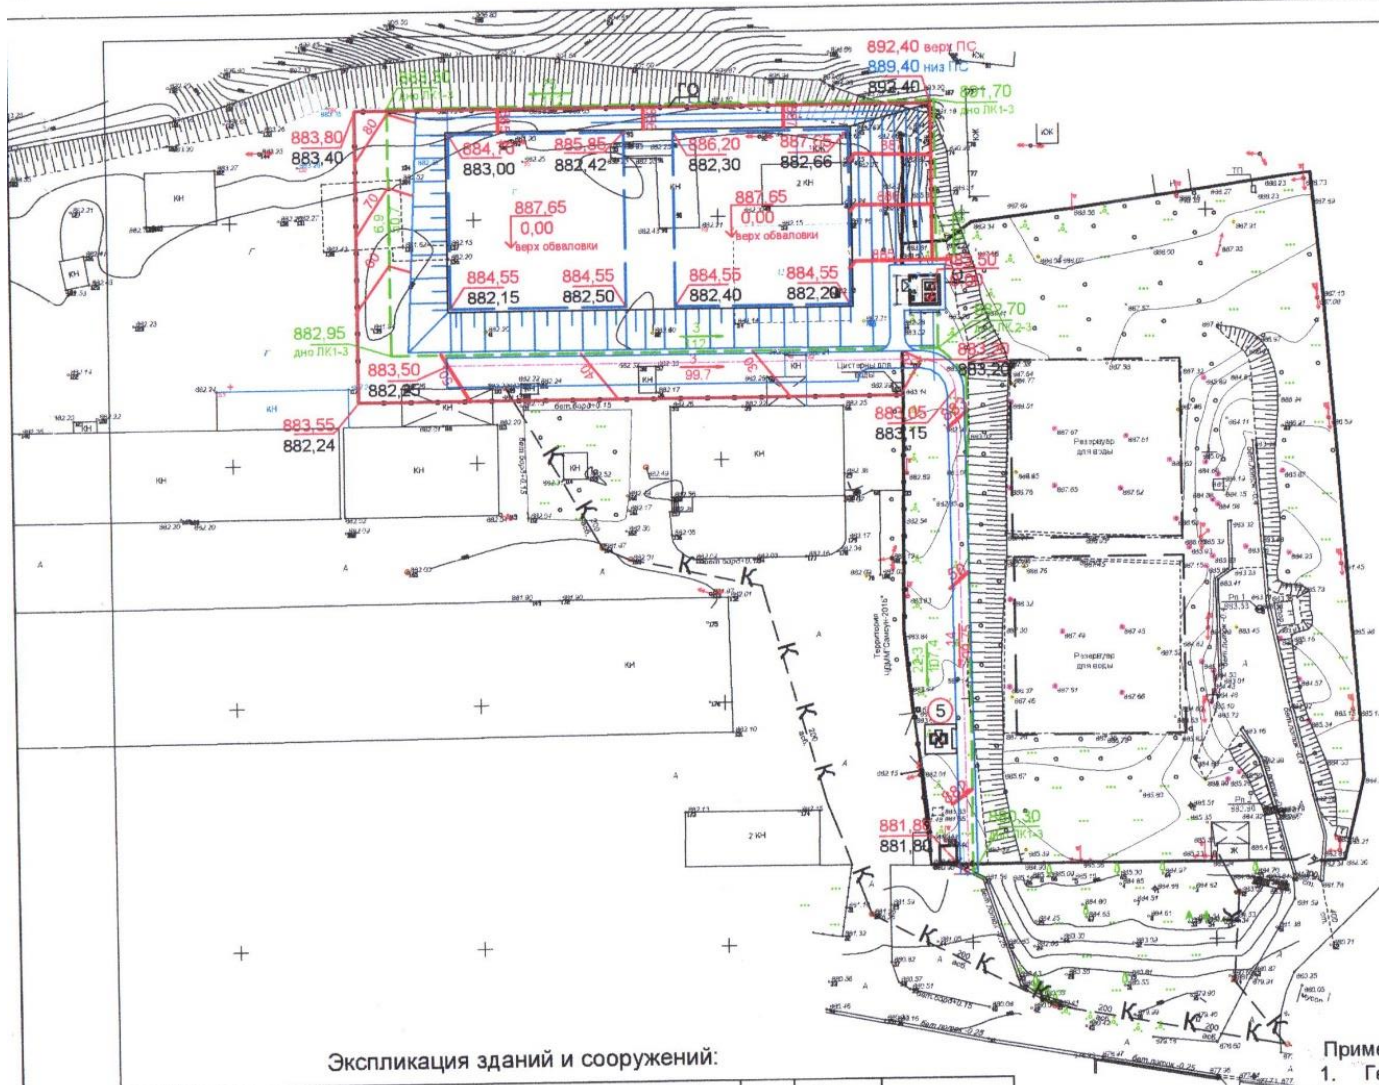

Условные обозначения:

- Граница территории - ограждение
- Существующая застройка
- Проектируемые резервуары
- Проектная отметка земли
- Существующая отметка земли
- Проектные горизонтали
- Проектируемый лоток ЛК 1-3
- Проектируемая подпорная стенка

Экспликация зданий и сооружений:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Резервуары 2x6000м3	м2	2649,92	
2	Существующая застройка			
3	Хлораторная	м2	42,52	
4	Караульная	м2	16,00	
5	Уборная на 2-очко	м2	16,00	
ОГ	Глухое ограждение из цемблоков h-3м с колючей проволокой h-0,5м	пм	409,30	
Вр	Ворота h-2м шир. -3,5м	шт	1	

Примечание:

- Генеральный план разработан на топосъемке выполненной 07. 2022г.
- Данный лист см с листом ГП-5.

					2023-01	ГП
					"Консультационные услуги для подготовки детального проекта по замене сетей водоснабжения, канализации и строительство двух резервуаров питьевой воды в районе Сино города Душанбе".	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
					Генеральный план	Стадия
					М 1:1000	Лист
						Листов
					РП	4
					7	
					Генеральный план	
					М 1:1000	
					План земельных масс	
					ОАО "Точиккоммунпроект"	
					Формат А3	

Таблица 1. Состояние экологических и социальных инструментов.

Код лота/контракта и тип инструмента SG (ESIA или ESMP)	Название подрядной организации	Начало (дата)	Состояние строительных работ (не начато, продолжается, завершено, введено в эксплуатацию)	ESMP/ESI A (не существует, составлен, принят Банком (данные))	Общественные слушания (данные)	Общая оценка выполнения ЕС текущих или завершённых работ (S, MS, MU, U)
DWSWP/W-01	«ТГЭМ»	07.02.2021г	Продолжено	Составлен, принят Банком	Проведено	Удовлетворительно
DWSWP/W-02	«ТаджикСГЭМ»	19.02.2021г	Завершено, введено в эксплуатацию	Составлен, принят Банком	Проведено	Удовлетворительно
DWSWP/W-03	«БСК и ТаджикСГЭМ»	20.10.2021г	Продолжается	Составлен, принят Банком	Проведено	Удовлетворительно
DWSWP/W-04	«Туннель Садди Ориоёно»	17.03.2022г	Продолжается	Составлен, принят Банком	Проведено	Удовлетворительно
DWSWP/W-05	«Интерсохтмон» и «ТГЭМ»	15.06.2023г	Не начато	Составлен	Проведено	
DWSWP/W-06	«Интерсохтмон»	01.05.2022г	Продолжается	Составлен, принят Банком	Проведено	Удовлетворительно
DWSWP/W-07	«ТГЭМ»	01.06.2022г	Продолжается	Составлен, принят Банком	Проведено	Удовлетворительно

#### 5.8. Контракт DWSWP/W-01 строительные работы по замене трубопроводов.

Гендерно значимые показатели/результаты: процент рабочих мест, нанятых на местной основе, из которых женщины - Факт 15 % от числа женщин; Цель 40 % от числа женщин.

Количество бенефициаров проекта 52%, из них женщин - Фактическое 50 % из них женщин; Целевое 50 % из них женщин.

Сначала реализации контракта со всеми сотрудниками подписаны трудовые соглашения. В составе трудового соглашения предусмотрены формы с требованием соблюдения правил поведения, которые подписаны каждым работником.

Условия проживания работников: рабочий персонал в количестве 6 человек (мужчины) проживают в арендуемых квартирах, инженер тоже в количестве 4 человек (мужчины),

проживают на арендуемых для них квартирах на территории городе Душанбе. Женщины живут в своих частных домах и своих квартирах.

#### **5.9. Контракт DWSWP/W-02** строительные работы по замене трубопроводов.

Гендерно значимые показатели/результаты: процент рабочих мест, нанятых на местной основе, из которых женщины - Факт 10 % от числа женщин; Цель 30 % от числа женщин. Количество бенефициаров проекта 54%, из них женщин - Фактическое 51 % из них женщин; Целевое 50 % из них женщин.

Сначала реализации контракта со всеми сотрудниками подписаны трудовые соглашения. В составе трудового соглашения предусмотрены формы с требованием соблюдения правил поведения, которые подписаны каждым работником.

Условия проживания работников: рабочий персонал проживает в отдельном здании (общежитии) – 12 человек (мужчины), а инженера в количестве 4 человек (мужчины), проживают на арендуемых для них квартирах на территории г. Душанбе. Женщины живут в своих частных домах и своих квартирах.

#### **5.10. Контракт DWSWP/W-03** строительные работы по замене трубопроводов.

Гендерно значимые показатели/результаты: процент рабочих мест, нанятых на местной основе, из которых женщины - Факт 15 % от числа женщин; Цель 30 % от числа женщин. Количество бенефициаров проекта 51%, из них женщин - Фактическое 50 % из них женщин; Целевое 50 % из них женщин.

Сначала реализации контракта со всеми сотрудниками подписаны трудовые соглашения. В составе трудового соглашения предусмотрены формы с требованием соблюдения правил поведения, которые подписаны каждым работником. который прилагается в приложение.

Условия проживания работников: рабочий персонал проживает в отдельном здании (общежитии) – 13 человек (мужчины), а инженера в количестве 3 человек (мужчины), проживают на арендуемых для них квартирах на территории города Душанбе. Женщины живут в своих частных домах и своих квартирах.

#### **5.11. Контракт DWSWP/W-04** строительные работы по замене трубопроводов.

Гендерные показатели/результаты: процентная доля наемных рабочих мест, из которых женщины - фактические 10 процентов от числа женщин; Целевой показатель для 20 процентов женщин.

Количество бенефициаров проектов 49 процент - женщины - фактические 50 процентов из них женщины; Целевой показатель 50 процентов из них составляют женщины.

С начала реализации договоров были подписаны трудовые договоры со всеми работниками. Трудовой договор включает в себя формы, требующие соблюдения правил поведения, которые подписывает каждый работник.

Рабочие на строительном объекте работали без защитных касок.

Условия проживания рабочих: рабочий персонал в количестве 12 человек (мужчины) проживают в квартирах, арендуемых для них в г. Душанбе. ИТР живут в своих частных квартирах. Женщины живут в своих частных домах и своих квартирах.

**5.12. Контракт DWSWP/W-06** строительные работы по замены канализационных трубопроводов.

Гендерные показатели/результаты: процентная доля наемных рабочих мест, из которых женщины - фактические 10 процентов от числа женщин; Целевой показатель для 30 процентов женщин.

Число бенефициаров проекта 54 процента - женщины - фактически 51 процент из них женщины; Целевой показатель 50 процентов из них составляют женщины.

С начала реализации договоров были подписаны трудовые договоры со всеми работниками. Трудовой договор включает в себя формы, требующие соблюдения правил поведения, которые подписывает каждый работник.

Условия проживания сотрудников: рабочий персонал проживает в отдельном здании (общежитии) – 12 рабочие (мужчины) и инженеры в количестве 4 человек (мужчины) проживают в квартирах, арендуемых для них в г. Душанбе. Женщины живут в своих частных домах и своих квартирах.

**5.13. Контракт DWSWP/W-07** строительные работы по замены канализационных трубопроводов.

Гендерно значимые показатели/результаты: процент рабочих мест, нанятых на местной основе, из которых женщины - Факт 15 % от числа женщин; Цель 40 % от числа женщин.

Количество бенефициаров проекта 52%, из них женщин - Фактическое 50 % из них женщин; Целевое 50 % из них женщин.

Сначала реализации контракта со всеми сотрудниками подписаны трудовые соглашения. В составе трудового соглашения предусмотрены формы с требованием соблюдения правил поведения, которые подписаны каждым работником.

Условия проживания работников: рабочий персонал в количестве 14 человек (мужчины) проживают в квартирах, арендуемых для них в городе Душанбе, инженеры в количестве 2 человек (мужчины) тоже проживают на арендуемых для них квартирах на территории города Душанбе. Женщины живут в своих частных домах и своих квартирах.

Таблица 3. Таблица гендерных соотношений контрактов

№	Название организации	Название пакета	Общая число работников	Мужчины	Женщины
1	«ТГЭМ»	DWSWP/W-01	17	13	4
2	«ТаджикСГЭМ»	DWSWP/W-02	34	32	2
3	«БСК и ТаджикСГЭМ»	DWSWP/W-03	37	33	4
4	«Туннель Садди Ориёно»	DWSWP/W-04	38	36	2
5	«Интерсохтмон»	DWSWP/W-06	36	34	2
6	«ТГЭМ»	DWSWP/W-07	31	29	2

## 6. Реализация механизма рассмотрения жалоб (МРЖ)

Во второй квартал 2023 год в ГУП ДВК поступило 5673 жалоб, из которых 5615 жалобы были рассмотрены и реализованы и 58 жалоб находится на обработке и выполнении ГУП ДВК. Большая часть жалоб связана с перебоями водоснабжения, низким давлением воды и поломкой канализационных сетей.

Со стороны населения в Проект водоснабжения и водоотведения района Сино города Душанбе жалоб не поступила.

## 7. Отчет плана мероприятий по защите от COVID-19

№	Мероприятия	Ответственные	Сроки выполнения	Срок и отчетности	Статус на 30 июня 2023 года
1.	<b>Применение способов предотвращения распространения COVID-19 на рабочем месте</b>				
	1.1. Регулярное протирание дезинфицирующими средствами поверхности и предметов: столов, стульев, телефонов и клавиатуры.	Специалист по экологическим гарантиям	Ежедневно	Ежеквартально	Выполняется ежедневно
	1.2. Установка и пополнение дезинфицирующих дозаторов для протирания рук на видных местах рабочего места.	Администратор	При необходимости	Ежеквартально	Установлено и пополняется при необходимости
	1.3. Установка плакатов, рекламирующих мытье рук и пропагандирующих респираторную гигиену.	Администратор	В течении пандемии	Ежеквартально	Установлено на строительных объектах.
	1.4. Применение других коммуникационных мер (предоставление рекомендаций от сотрудников по охране труда и технике безопасности, брифинги на собраниях и информация в интернете для поощрения мытья рук).	Администратор	Регулярно	Ежеквартально	Выполнено
	1.5. Обеспечение доступа к местам мытья рук (наличие умывальников, кранов с водой и мыла).	Администратор	Постоянно	Ежеквартально	Имеется

	1.6. Предоставление рекомендаций от специалистов по охране труда, инструктаж на собраниях и информация во внутренней сети и т. д.	Специалист по экологическим гарантиям	Ежемесячно	Ежеквартально	Выполняется
	1.7. Обеспечение масками сотрудников на рабочем месте.	Администратор	Постоянно	Ежеквартально	Обеспечивается
	1.8. Оповещение сотрудников, подрядчиков и клиентов о следующих мерах при распространении COVID-19:  - оставаться дома при появлении легкого кашля или субфебрильной температуры (37,3 ° С или выше);  - оставаться дома (или работать из дома), если пришлось принимать простые лекарства, такие как парацетамол, ибупрофен или аспирин, которые могут маскировать симптомы инфекции.	Специалист по экологическим гарантиям	При возникновении	Ежеквартально	Выполняется
<b>2.</b>	<b>Управление рисками от COVID-19 при организации встреч и мероприятий</b>				
	2.1. Разработка и согласование плана готовности для предотвращения заражения на встречах или мероприятиях.	Специалист по экологическим гарантиям  Администратор	Единожды	Ежеквартально	Разработаны и согласованы
	2.2. Использование телеконференций или онлайн-мероприятий.	Администратор	При необходимости	Ежеквартально	Использовано во время встречах
	2.3. Обеспечение достаточного количества принадлежностей, включая масок для лица, салфеток и дезинфицирующих средств для всех участников.	Администратор	Во время проведения встреч	Ежеквартально	Имеется
	2.4. Составление списка контактной информации участников: номер мобильного телефона, адрес электронной почты и домашний адрес.	Администратор	Во время проведения встреч	Ежеквартально	Составлен список участников в онлайн встречах
	2.5. Разработка и согласование плана реагирования на возникновение случая заболевания лиц с симптомами COVID-	Специалист по экологическим	Во время проведения встреч	Ежеквартально	Разработаны и согласованы

	19 (сухой кашель, лихорадка, недомогание).	им гарантиям			
	2.6. Принятие действенных мер в случае выявления у участников встречи, сотрудников или поставщика услуг положительный результат теста на COVID-19 в ходе или сразу после встречи.	Специалист по экологическим гарантиям	Во время проведения встреч	Ежеквартально	Не выполнено, в связи с отсутствием случаев заражения участников встреч.
	2.7. Предоставить информацию или брифинг, желательно как устно, так и письменно, о COVID-19 и мерах, которые предпринимают организаторы, чтобы сделать это мероприятие безопасным для участников.	Специалист по экологическим гарантиям	До проведения встреч	Ежеквартально	Разработана и роздана во время встречи с подрядными организациями информационная брошюра о мерах по защите от COVID-19.
	2.8. Обеспечение средствами гигиены (антисептики или спиртовые салфетки) всех участников встречи или мероприятия.	Администратор	Во время проведения встреч	Ежеквартально	Обеспечено подрядные организации антисептическими средствами и масками.
	2.9. Предоставление контактной информации или номер горячей линии по вопросам здоровья, по которой участники могут позвонить за советом или информацией.	Администратор	Во время проведения встреч	Ежеквартально	Имеются контактные данные медицинских служб города.



	2.10. Обеспечить меры по соблюдению участниками социальной дистанции.	Администра тор	Во время проведения встреч	Ежеквар тально	Выполня ется
	2.11. Обеспечение хорошей вентиляции помещения.	Администра тор	Во время проведения встреч	Ежеквар тально	Имеется
	2.12. Оповещение всех сотрудников о возникновении случаев изоляции лиц, с подозрением в заражении COVID-19	Администра тор	Во время проведения встреч	Ежеквар тально	Случаи заражени я не выявлены
<b>3.</b>	<b>Правила во время служебных поездок</b>				
	3.1. Обеспечение сотрудников свежей информацией об областях, в которых распространяется COVID-19 с использованием интернет-ресурсов. <a href="https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/">https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/</a>	Специалист по экологическим гарантиям	Перед каждой поездкой	Ежеквар тально	При необходи мости
	3.2. Прохождение инструктажа сотрудников, которые должны выехать в служебную командировку в места, сообщающие о COVID-19 со стороны квалифицированных специалистов (например, службой здравоохранения, поставщиком медицинских услуг или местным партнером в области общественного здравоохранения).	Специалист по экологическим гарантиям	Перед каждой поездкой	Ежеквар тально	При необходи мости
	3.3. Обеспечение командированных сотрудников средствами для протирания рук на спиртовой основе.	Администра тор	Перед каждой поездкой	Ежеквар тально	При необходи мости
	3.4. Контроль состояния сотрудников, которые вернулись из района, где распространяется COVID-19 путем наблюдения симптомов в течение 14 дней и измерения температуры дважды в день.	Специалист по экологическим гарантиям	По приезду	Ежеквар тально	При необходи мости
<b>4.</b>	<b>Подготовка рабочего места на случай, если COVID-19 появился в районе нахождения</b>				
	4.1. Разработка плана действий на случай заболевания сотрудников с подозрением на COVID-19 на одном из рабочих мест.	Специалист по экологическим гарантиям	При возникновении	Ежеквар тально	Будет разработа н в случае возникно вения
	4.2. Принятие мер по выявлению людей, которые могут подвергаться риску, и поддерживать их без привлечение	Специалист по экологическим	Ежедневно	Ежеквар тально	Выполне но

	стигмы и дискриминации на свое рабочее место.	им гарантиям			
	4.3. Разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях и обеспечения непрерывности работы на случай вспышки болезни в сообществах, где работает организация.	Специалист по экологическим гарантиям	Регулярно	Ежеквартально	Будет разработан при необходимости
	4.4. Составление планов с местными поставщиками медицинских и социальных услуг для малых и средних предприятий, не имеющих поддержки в области здравоохранения и социального обеспечения.	Специалист по экологическим гарантиям	При необходимости	Ежеквартально	Не составлено

## 8. Анализ хода строительных работ по соблюдению требований правил охраны окружающей среды и социальных гарантий.

В рамках реализации Проекта по водоснабжению и водоотведению города Душанбе реализуется контракты по замене водопроводных трубопроводов и канализационных коллекторов. В целях соблюдения экологических и социальных стандартов Всемирного Банка по строительным контрактам со стороны ОП регулярно проводится мониторинг объектов строительства по следующим контрактам: DWSWP/W-01 подрядчик ОАО «Таджикгидроэлектромонтаж», DWSWP/W-02 подрядчик ОАО «ТаджикСГЭМ», DWSWP/W-03 подрядчик СП ОАО «ТаджикСГЭМ» и АО «Большая строительная компания», DWSWP/W-04 подрядчик АОИК «Туннель Садди Ориено», DWSWP/W-06 подрядчик ООО «ИНТЕРСОХТМОН» и DWSWP/W-07 подрядчик ОАО «Таджикгидроэлектромонтаж». В ходе встречи с подрядными организациями было выявлено что все подрядные организации, ежеквартально с работниками проводят инструктаж по соблюдению техники безопасности, и все работники расписывают в журналах техники безопасности, что ознакомились с правилами техники безопасности.

На строительных участках установлены предупреждающие дорожные знаки и сигнальные ленты.

Все транспорты подрядных организации заправляются ГСМ в определённых местах в автобазах или в АЗС, чтобы не загрязнят почвы земли строительных участков.

Во всех строительных участках, после укладки трубопроводов над мягким грунтам или песком укладывается сигнальная лента для безопасности.

В некоторых строительных участках опрыскивают водой для предотвращения пыли, и чтобы не загрязнялись зелёные растения и деревья.

Вовремя замены трубопроводов, старые трубы не демонтируются, старые трубопроводы остаются под землёй.

С объектов строительные мусор и не пригодный грунт вывозят в специально определенные и разрешённые места со стороны Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан.

В ночное время суток строительные работы на участках не ведутся, в целях не нарушения покоя населения.

## 9. Фотоматериалы

Фотографии строительных участков DWSWP/W-01, ул. Зарафшон, участок 5, после завершения работ. 04.05.2023г.





Фотографии строительных участков DWSWP/W-03, ул. Навобод, участок 3,  
22.05.2023г.





Информационний щит DWSWP/W-03



Мақомоти иҷроияи  
Ҳокимияти давлатии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Мақомоти иҷроияи  
Ҳокимияти давлатии  
шаҳри Душанбе



THE WORLD BANK  
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP  
Банки Ҷаҳонӣ



КОҶОИИ ВОҶИҶИ ҶАВЛАТИИ  
«СБҶ КОҶИЗИ ДУШАНБЕ»  
Корхонаи воҳиди  
давлатии "Обу корези  
Душанбе"



Ҷамъияти саҳомии  
кушодаи  
"ТоҷикСГЭМ"



АО «БСК»

### DWSWP/W - 03 "Иваз намудани кубурҳои обтаъминкунии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе"

№и Ҷ	Сурати маълумот	Ҳаҷми кубурҳои ағҷабӣ ва муҳабба	Дарозии муҳабба
Минтақаи №1	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	4181,2 км
Минтақаи №2	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	2220,1 км	252,2 км
Минтақаи №3	Дар ҷумҳурии Тоҷикистон...	862,5 км	252,2 км
Минтақаи №4	Дар ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №5	Дар минтақаи №1 ва №2...	2220,1 км	252,2 км
Минтақаи №6	Дар минтақаи №3 ва ҷумҳурии Тоҷикистон...	862,5 км	252,2 км
Минтақаи №7	Дар ҷумҳурии Тоҷикистон...	2220,1 км	252,2 км
Минтақаи №8	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №9	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №10	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №11	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №12	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №13	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №14	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №15	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №16	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №17	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №18	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №19	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №20	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №21	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №22	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №23	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №24	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №25	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №26	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №27	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №28	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №29	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №30	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №31	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №32	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №33	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №34	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №35	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №36	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №37	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №38	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №39	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №40	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №41	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №42	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №43	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №44	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №45	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №46	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №47	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №48	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №49	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Минтақаи №50	Дар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон...	1824,5 км	252,2 км
Ҷамъӣ	Ҷамъаи кубурҳои муҳабба	1824,5 км	252,2 км



Харитаи маҳалли ҷойгиршавии минтақаҳои лоиҳа -  
ноҳияи Синои шаҳри Душанбе

**Маълумотнома**  
**Рақами Грант: D4780-TJ**  
**Номгуи Қарордод: DWSWP/W-03**  
**«Иваз намудани кубурҳои обтаъминкунии»**  
**Қарори Раиси шаҳри Душанбе дар бораи додани иҷозати корҳои сохтмонӣ дар қисмати шимолу ғарбии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе аз 22 ноябри соли 2021, №670**  
**Фармоишгар: КВД «Обу корези Душанбе»**  
**Пудратчӣ: ҶСК «ТоҷикСГЭМ» АО «БСК»**  
**Оғози кор: 20.10.2021**  
**Анҷомикор: 20.09.2023**  
**Эзоҳ: Шумораи коргарон 25 нафар, аз ҷумла 5 нафар муҳандисон ва 20 нафар коргарон.**  
**Сардори китъа: Саидзола Э.**



DWSWP/W-03, ул. Варзишгарон, участок 77, 02.06.2023г.



DWSWP/W-03, ул. Каримова, участок 79, после завершения работ. 07.06.2023г.






Фотографии лагеря для проживания работников DWSWP/W-03





Фотографии строительных участков DWSWP/W-04, ул. Зафар, участок 40,  
13.06.2023г.

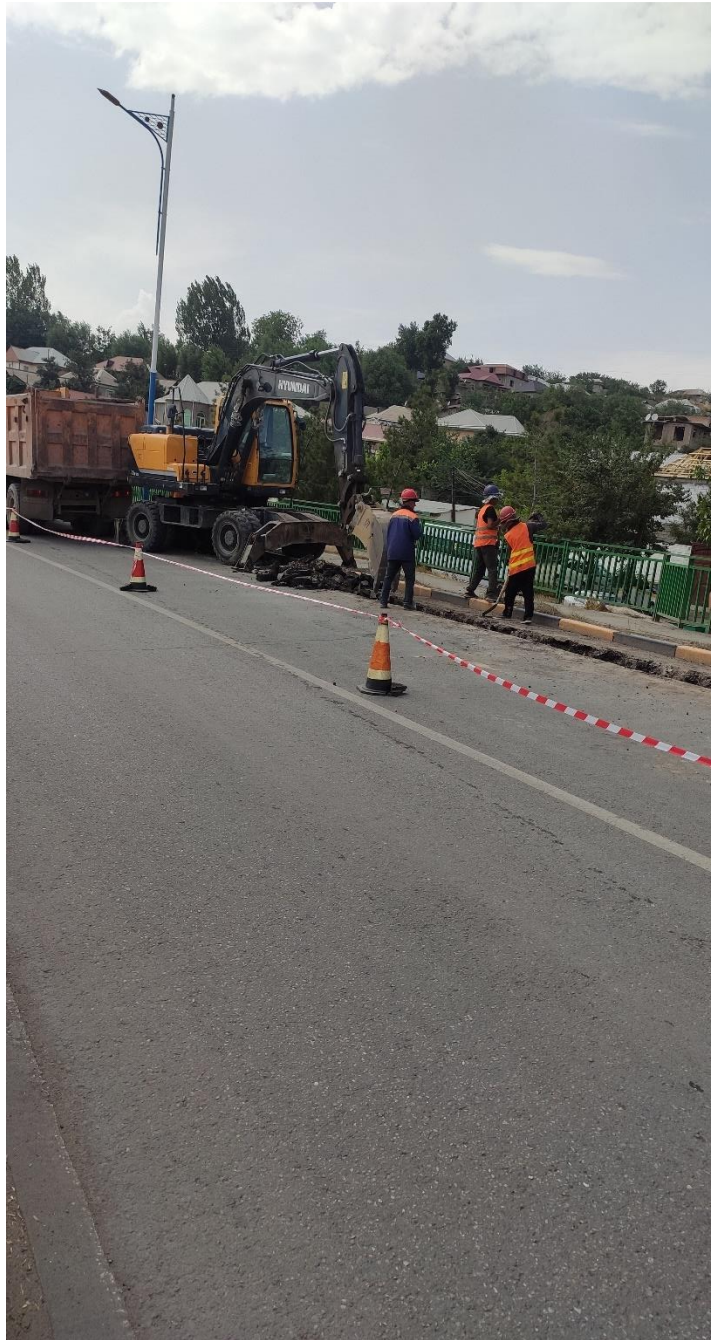









 <p>Мақомоти иҷроияи Ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон</p>	 <p>Мақомоти иҷроияи Ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе</p>	 <p><b>THE WORLD BANK</b> IBRD • ICA • WORLD BANK GROUP</p> <p>Банки Ҷаҳонӣ</p>	 <p>Корхонаи воҳиди давлатии «Обу корези Душанбе»</p>	 <p>ЗАО "ТСА"</p>
--	--	--	---	--

**DWSWP/W-04 "Иваз намудани кубурҳои магистралӣи ноҳияи Сино шаҳри Душанбе"**



Харитаи маҳалли ҷойгиршавии лонҳои: н. Сино ш. Душанбе

Маълумотнома  
Номгуи қарордод  
DWSWP/W-04 "Иваз намудани  
кубурҳои магистралӣ"  
барои додани иҷозати қорхон  
сохтмонӣ дар қисмати шимолу  
ғарбии ноҳияи Сино шаҳри  
Душанбе аз 14 апрели соли 2022  
№176

Фармоншгар: КВД "Обу корези Душанбе"

Пудратчи: ЗАО "ТСА"

Шахси масъул тел: +992 900004760


DWSWP/W-04, ул. Шамси, участок 64, после завершения работ. 13.06.2023г.







Фотографии строительных участков DWSWP/W-06, ул. Мухаммадиев 70, участок 4, бетонирование участка 28.04.2023г.

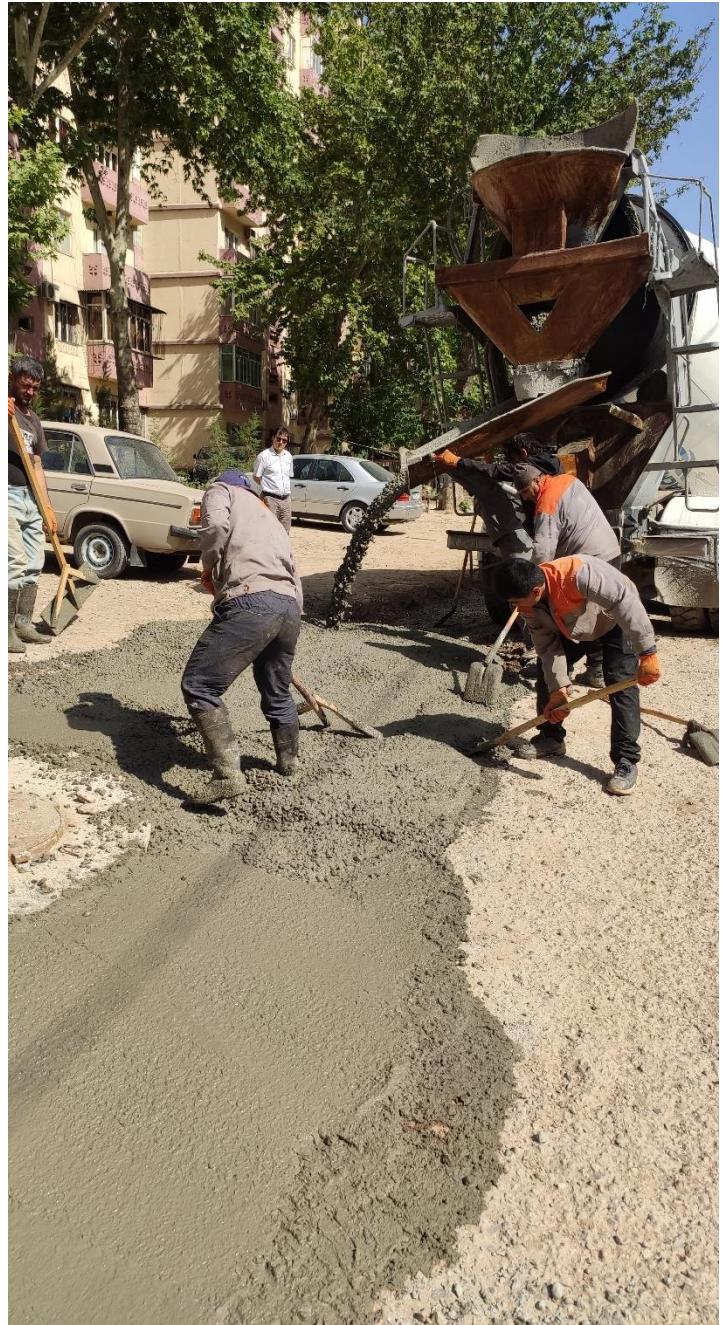







Мақомоти иҷроияи  
Ҳокимияти давлатии  
шаҳри Душанбе



Мақомоти иҷроияи  
Ҳокимияти давлатии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон



**WORLD BANK GROUP**  
Банки Чаҳонӣ



Корхонаи воҳиди  
давлатии "Обу корези  
Душанбе"



ҶДММ «Интерсохтмон»

**DWSWP/W-06 «Иваз намудани кобури корези ноҳия  
Синои шаҳри Душанбе»**

№	Номи объект	Сана	Ҳаҷми кӯб (м³)	Ҳаҷми кӯб (м³)
1	Кобури №1	2022.06.01	1000	1000
2	Кобури №2	2022.06.01	1000	1000
3	Кобури №3	2022.06.01	1000	1000
4	Кобури №4	2022.06.01	1000	1000
5	Кобури №5	2022.06.01	1000	1000
6	Кобури №6	2022.06.01	1000	1000
7	Кобури №7	2022.06.01	1000	1000
8	Кобури №8	2022.06.01	1000	1000
9	Кобури №9	2022.06.01	1000	1000
10	Кобури №10	2022.06.01	1000	1000
11	Кобури №11	2022.06.01	1000	1000
12	Кобури №12	2022.06.01	1000	1000
13	Кобури №13	2022.06.01	1000	1000
14	Кобури №14	2022.06.01	1000	1000
15	Кобури №15	2022.06.01	1000	1000
16	Кобури №16	2022.06.01	1000	1000
17	Кобури №17	2022.06.01	1000	1000
18	Кобури №18	2022.06.01	1000	1000
19	Кобури №19	2022.06.01	1000	1000
20	Кобури №20	2022.06.01	1000	1000
21	Кобури №21	2022.06.01	1000	1000
22	Кобури №22	2022.06.01	1000	1000
23	Кобури №23	2022.06.01	1000	1000
24	Кобури №24	2022.06.01	1000	1000
25	Кобури №25	2022.06.01	1000	1000
26	Кобури №26	2022.06.01	1000	1000
27	Кобури №27	2022.06.01	1000	1000
28	Кобури №28	2022.06.01	1000	1000
29	Кобури №29	2022.06.01	1000	1000
30	Кобури №30	2022.06.01	1000	1000
31	Кобури №31	2022.06.01	1000	1000
32	Кобури №32	2022.06.01	1000	1000
33	Кобури №33	2022.06.01	1000	1000
34	Кобури №34	2022.06.01	1000	1000
35	Кобури №35	2022.06.01	1000	1000
36	Кобури №36	2022.06.01	1000	1000
37	Кобури №37	2022.06.01	1000	1000
38	Кобури №38	2022.06.01	1000	1000
39	Кобури №39	2022.06.01	1000	1000
40	Кобури №40	2022.06.01	1000	1000
41	Кобури №41	2022.06.01	1000	1000
42	Кобури №42	2022.06.01	1000	1000
43	Кобури №43	2022.06.01	1000	1000
44	Кобури №44	2022.06.01	1000	1000
45	Кобури №45	2022.06.01	1000	1000
46	Кобури №46	2022.06.01	1000	1000
47	Кобури №47	2022.06.01	1000	1000
48	Кобури №48	2022.06.01	1000	1000
49	Кобури №49	2022.06.01	1000	1000
50	Кобури №50	2022.06.01	1000	1000



Харитаи маҳалли ҷойгиршавии минтақаҳои  
лоиҳаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе

**Рақами Грант: D4780-TJ**  
**Номгӯи Қарордод: DWSWP/W-06**  
**«Иваз намудани кобури корези»**  
**Қарори раиси шаҳри Душанбе**  
**дар бораи додани иҷозати қорҳои**  
**сохтумони дар мавзеоҳои қисмати**  
**шимоли ғарбии ноҳияи Синои**  
**шаҳри Душанбе**  
**аз 20 июни соли 2022 №307**  
**Фармоҳишгар: КВД «Обу корези**  
**Душанбе»**  
**Пудратҷӣ: ҶДММ «Интерсохтмон**  
**Оғози кор: 20.06.2022**  
**Анҷоми кор: 20.05.2024**  
**Менеджер праект Буритошов О**  
**Прааб Муминов О**  
**Тел: (992) 981 11 22 45**  
**Тел: (992) 981 11 22 42**

DWSWP/W-06, ул. Шамси, участок 7, опрыскивание участок воды, 03.05.2023г.









DWSWP/W-06, ул. Зарафшон, участок 8, после завершения работ, 01.06.2023г.



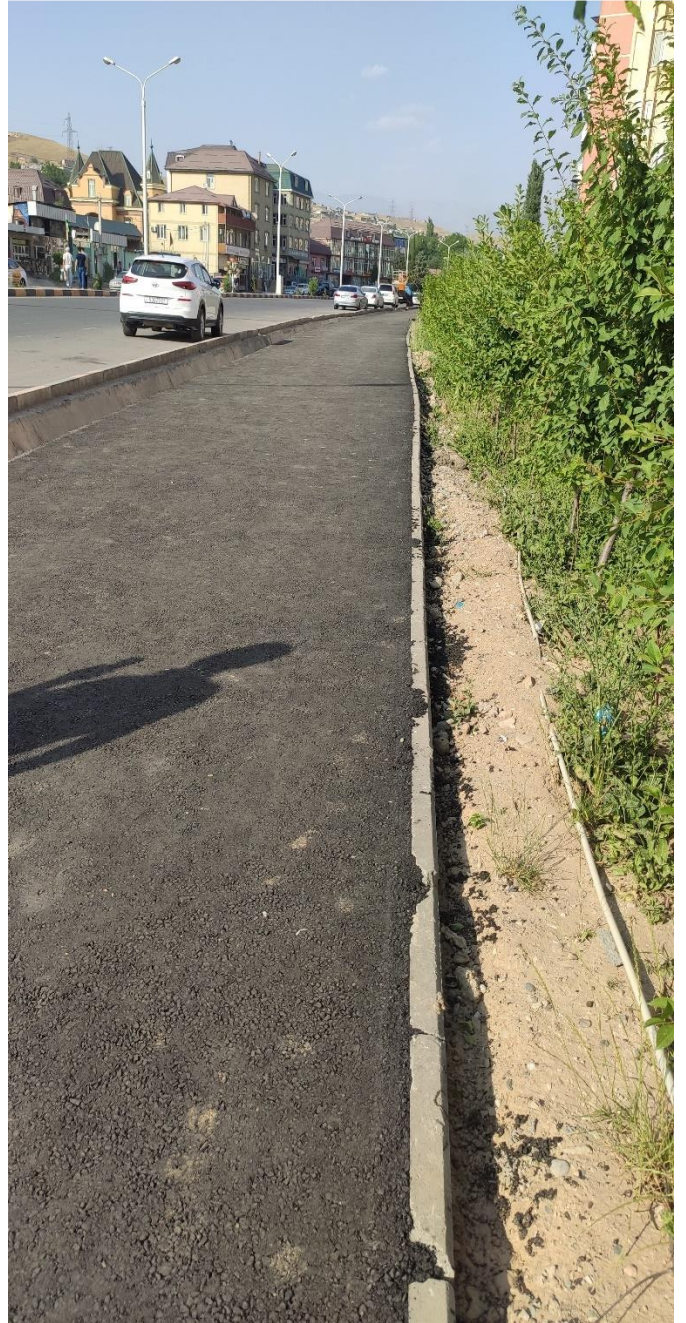

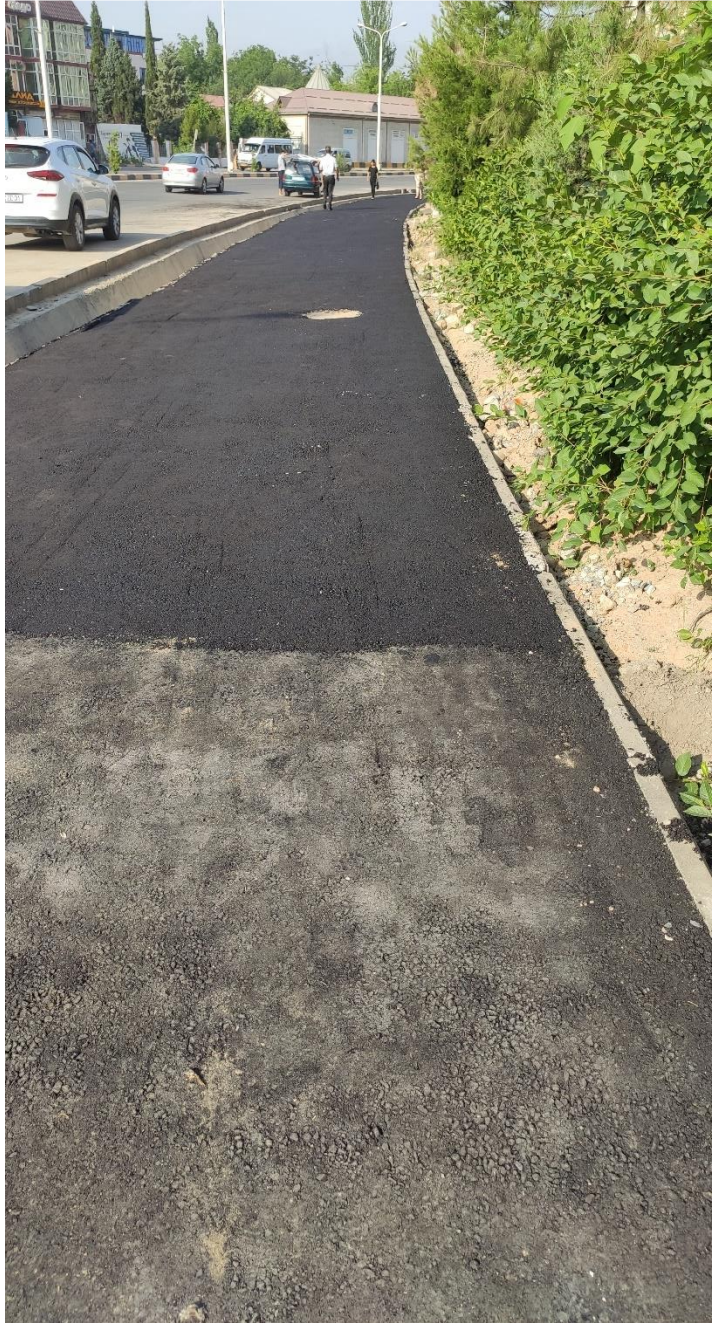

Фотографии лагеря для проживания работников DWSWP/W-06















Фотографии строительных участков DWSWP/W-07, ул. Зарафшон, участок 1,







Мақомоти иҷроияи  
Ҳокимияти давлатии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Мақомоти иҷроияи  
Ҳокимияти давлатии  
шаҳри Душанбе



Банки Ҷаҳонӣ



Корхонаи воҳиди давлатии  
«Обу қорези Душанбе»



Ҷамъияти саҳҳомии  
қушодаи "ТГЭМ"

**DWSWP/W-07 "Иваз намудани қубурҳои канализатсионии ноҳияи Сино шаҳри Душанбе"**



Харитаи маҳалли ҷойгиршавии лона-и. Сино ш. Душанбе

Маълумотнома  
Номгӯи қарордод  
DWSWP/W-07 "Иваз намудани  
қубурҳои канализатсионӣ"  
барои додани иҷозати қорхон  
сохтмонӣ дар қисмати шимолу  
ғарбии ноҳияи Сино шаҳри  
Душанбе аз 18 июли соли 2022  
№371

Фармоишгар: ҚВД "Обу қорези Душанбе"

Пудратчи: ЧСК "ТГЭМ"

Шахси масъул тел: +992 915316929
